

INTERVENTION PLANIFIEE 206
N/REF : 1/05/2025 50H28 C:001009 I:00136

SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : FOSSE RETENTION/STATION - CONTACTER MR DUFRAICHE TEL 02 23 40 23 23
OU 02 23 40 24 64

MOTIF : Intervention bimestrielle

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

ENTRETIEN DU 07/05 (ASSAINISSEMENT)
- 1 STATION DE RELEVAGE EAUX USEES 7 M3 SITUEE EXTERIEUR VOIE ACCES
FOURNISSEURS

REMARQUE : RÉSEAU TOUJOURS EN CHARGE, SUSPICION DE PROBLEME SUR LE
RÉSEAU DE LA VILLE

INTERVENTION DU 07/05 (PLOMBERIE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU POSTE DE RELEVAGE
CONSTAT : LE POSTE DE RELEVAGE EST PLEIN
MISE EN ROUTE DES POMPES DE RELEVAGE
CONSTAT : CELA N'ÉVACUE PAS DANS LE RÉSEAU DE LA VILLE. LE RÉSEAU
DOIT ETRE ENGORGÉ
REMARQUE : APPEL DU CADRE D'ASTREINTE RENNES METROPOLE POUR ENVOI SUR
PLACE D'UNE ÉQUIPE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 07/05 (FIN D'APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOCAL VELO : ACCES IMPOSSIBLE
VISITE DU SITE AVEC SERVICE D'ASTREINTE ASSAINISSEMENT VILLE DE RENNES
REPÉRAGE DES REGARDS DE VIDANGE DES EAUX
RECHERCHE DU CODE LOCAL VÉLO POUR ACCES AU TABLEAU ÉLECTRIQUE : C3469Z
DÉPOSE DE LA POMPE 2 POUR CONTROLE : AUCUN BLOCAGE
REMISE EN PLACE DE LA POMPE
ÉCHANGE CABLAGE
REMISE EN PLACE DE LA POMPE EN FONCTIONNEMENT INVERSÉ
CONSTAT : LA POMPE N°2 FONCTIONNE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 09/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES POMPES

CONSTAT : POMPE 2 TOUJOURS EN DÉFAUT. POMPE 1 ÉVACUE PARTIELLEMENT.

PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR UN VIDAGE COMPLET DES DEUX FOSSES. EFFECTUER

UN CONTROLE DANS UN PREMIER TEMPS DU FOND DE FOSSE ET DES CLAPETS AR

ET PREVOIR UN PASSAGE CAMERA DANS UN SECOND TEMPS AVEC DÉTECTION RÉSEAU

POUR TROUVER LA SORTIE DES POMPES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 13/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

POMPAGE ET NETTOYAGE FOSSE DE RELEVAGE 12M2

REMARQUE : RÉSEAU EN CHARGE

BALISAGE DE LA RUE, MISE EN SÉCURITÉ DU PERSONNEL

DÉPOSE DES DEUX POMPES

CONTROLE DE LA FOSSE

DÉPOSE DES BRIDES RACCORDANT LES ÉVACUATIONS

NETTOYAGE HAUTE PRESSION

REPOSE DES DEUX POMPES

CONSTAT : LA TURBINE DE LA POMPE 2 (LA PLUS ANCIENNE) EST BLOQUÉE, EN

ATTENTE DE RETOUR FOURNISSEUR POUR SAV OU REMPLACEMENT. BON

FONCTIONNEMENT DE LA POMPE 1. ENLEVEMENT DE PLUSIEURS MORCEAUX DE

GRAISSE DANS LA CONDUITE. ABSENCE DE CLAPET AR. RAILS DE GUIDAGE EN

MAUVAISE ÉTAT.

REMARQUE : A NOTRE DÉPART, LA POMPE 1 FONCTIONNE ET L'ÉVACUATION SE FAIT DE FAÇON CORRECT

NETTOYAGE ET DÉPOSE POMPE FOURNISSEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/05/25 a 15H02 M. S. DUFRAICHE

MG LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 a 14H20 M. S. DUFRAICHE

Suite a donner : OUI. Le 07/05/2025 a 19:00

Suite a donner : OUI. Le 09/05/2025 a 10:47

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Entretien Station de Relevage le 07/05	1	137,97		137,97
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/05	1	69,24		207,72
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/05	1	69,24		69,24

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	Ff Pompage a l'heure +Dépl. le 13/05	1	163,64	654,56
6,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/05	1	69,24	415,44
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 07/05	1	40,66	40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 09/05	1	40,66	40,66
2,00	Traitement déchets <=1M3 07/05	1	25,03	50,06
12,00	Traitement déchets <=1M3 13/05	1	25,03	300,36
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie 13/05	1	40,66	40,66
TOTAL H.T.				1957,33
T.V.A. a 20,00%				391,46
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>2348,79</u>

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



07:35 - 09:35 le 13/05/2025
1/5/2025 à 50h28 (FF)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

Immeuble : LECLERC CENTRE

RUE JULES VALLES

35000 RENNES

Immeuble sous contrat

Motifs du bon

ENTRETIEN DE :

- 1 STATION DE RELEVAGE EAUX USEES 3 M3

SITUEE EXTERIEUR VOIE ACCES

FOURNISSEURS

+ CURAGE

* INTERVENTION EN MEME TEMPS QUE

NICOLAS U7

* PRENDRE MAN ET 320

* NETTOYAGE FOSSE

Localisations (AE)

FOSSE RETENTION/STATION - CONTACTER MR

DUFRAICHE TEL 02 23 40 23 23

OU 02 23 40 24 64

Horaires

Pointages

SP : 13\05 à 07 h 35

ES : 13\05 à 12 h 50

Dates saisies

Début : 13\05 à 07 h 30

Fin : 13\05 à 13 h 30

Dates client

Début : 13\05 à 07 h 30

Fin : 13\05 à 07 h 45

Demande



Commentaires

Description


Balisage de la rue, mise en sécurité du personnels. Aspiration des fosses. Nettoyage . Dépose des 2 pompes. Descente dans la fosse. Dépose des brides raccordant les évacuations. Passage de la HP. Remontage de l'ensemble. Constatation : Pompe 2 (la plus ancienne) turbine bloqué en attente de retour fournisseur pour SAV ou remplacement. Pompe 1 ok (neuve) Enlèvement de plusieurs morceaux de graisse dans la conduite. Absence de clapet AR .rails de guidage en mauvaise état. A notre départ, la pompe 1 fonctionne et l'évacuation se fait de façon correct. Nettoyage et dépose pompe fournisseur Devis à effectué : remplacement de 2 rails de guidage 2 x 4 ml Mise en place de 2 clapets AR diamètre 75 sur bride en fond de fosse. Remplacement des 4 flotteurs. Mise en place des flotteurs sur équerre de maintien. Détecteur 4 gaz, treuil + trépied, échelle de corde Prevoir 2 tech (u7 + shbir camion) 🚚 3heures u7 1h camion

Fournitures

Trépied + treuil x 1 Échelle de corde x 1
Détecteur 4 gaz x 1

Suite à donner : Non

Photos

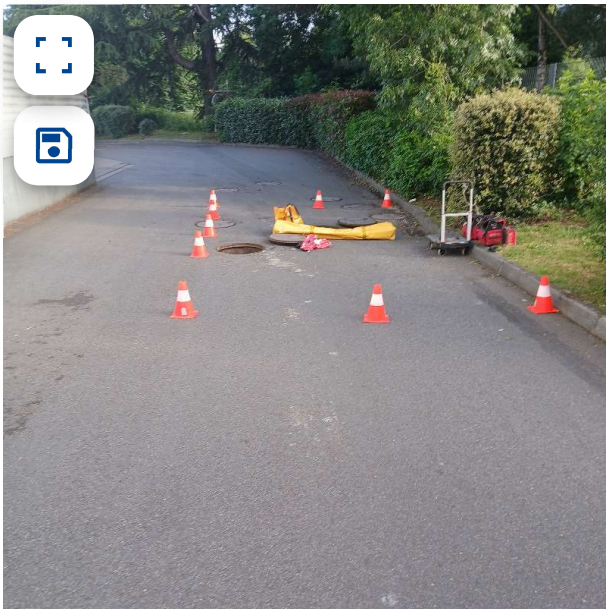

Signature

